PLANNING PRO DCE - TRAVAUX

Ind0_V3 du 15/04/2026

CREATION D'UN PERISCOLAIRE ALSH à GRESSWILLER

C2Bi Ingénierie de la Construction

N°	Activités	Durée
1	**PGRESS_Planning TRAVAUX**	
2	TRAVAUX	
3	Préparation	
4	Notification marchés - OS de démarrage	0 jour
5	Remise plans EXE ind. A aux entreprises	0 jour
6	Finalisation plans EXE - Concertation avec les entreprises	4 sem.
7	Période de préparation	8 sem.
8	Installation de chantier	1 sem.
9	Travaux	
10	01. CURAGE	4 sem.
11	02. GROS OEUVRE / DEMOLITION STRUCTURELLE	12 sem.
12	03. MACONNERIE / RENOVATION PATRIMONIALE	8 sem.
13	04. CHARPENTE BOIS / MOB / BARDAGE BOIS	6 sem.
14	05. COUVERTURE TUILES / ZINGUERIE	4 sem.
15	06. ETANCHEITE / ZINGUERIE	4 sem.
16	07. MENUISERIES EXTERIEURES BOIS	4 sem.
17	Hors d'eau - Hors d'air - Clos du bâtiment	0 jour
18	08. OCCULTATIONS SOLAIRES	3 sem.
19	09. FACADES	15 sem.
20	10. SERRURERIE	4 sem.
21	11. CLOISONS / DOUBLAGES / FAUX-PLAFONDS	14 sem.
22	12. MENUISERIES INTERIEURES BOIS / AGENCEMENT	6 sem.
23	13. CARRELAGE / FAIENCE / CHAPE	5 sem.
24	14. SOLS SOUPLES / CHAPE	5 sem.
25	15. PARQUET	3 sem.
26	16. PEINTURE	8 sem.
27	17. ELECTRICITE	50 sem.
28	18. ASSAINISSEMENT	3 sem.
29	19. PLOMBERIE SANITAIRE	50 sem.
30	20. CHAUFFAGE / VENTILATION	50 sem.
31	21. AMENAGEMENTS EXTERIEURS / ESPACES VERTS	4 sem.
32	22. ECHAFAUDAGES	18 sem.
33	23. NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE	4 sem.
34	Essais de mise en service	3 sem.
35	**Livraison**	
36	Opérations Préalables à la Réception	1 jour
37	Levée de réserves suite aux OPR	3 sem.
38	Constat de levée des réserves	1 jour
39	Réception - Remise des clés	0 jour
40	Emménagement utilisateurs	2 sem.
41	Mise en service du bâtiment	0 jour

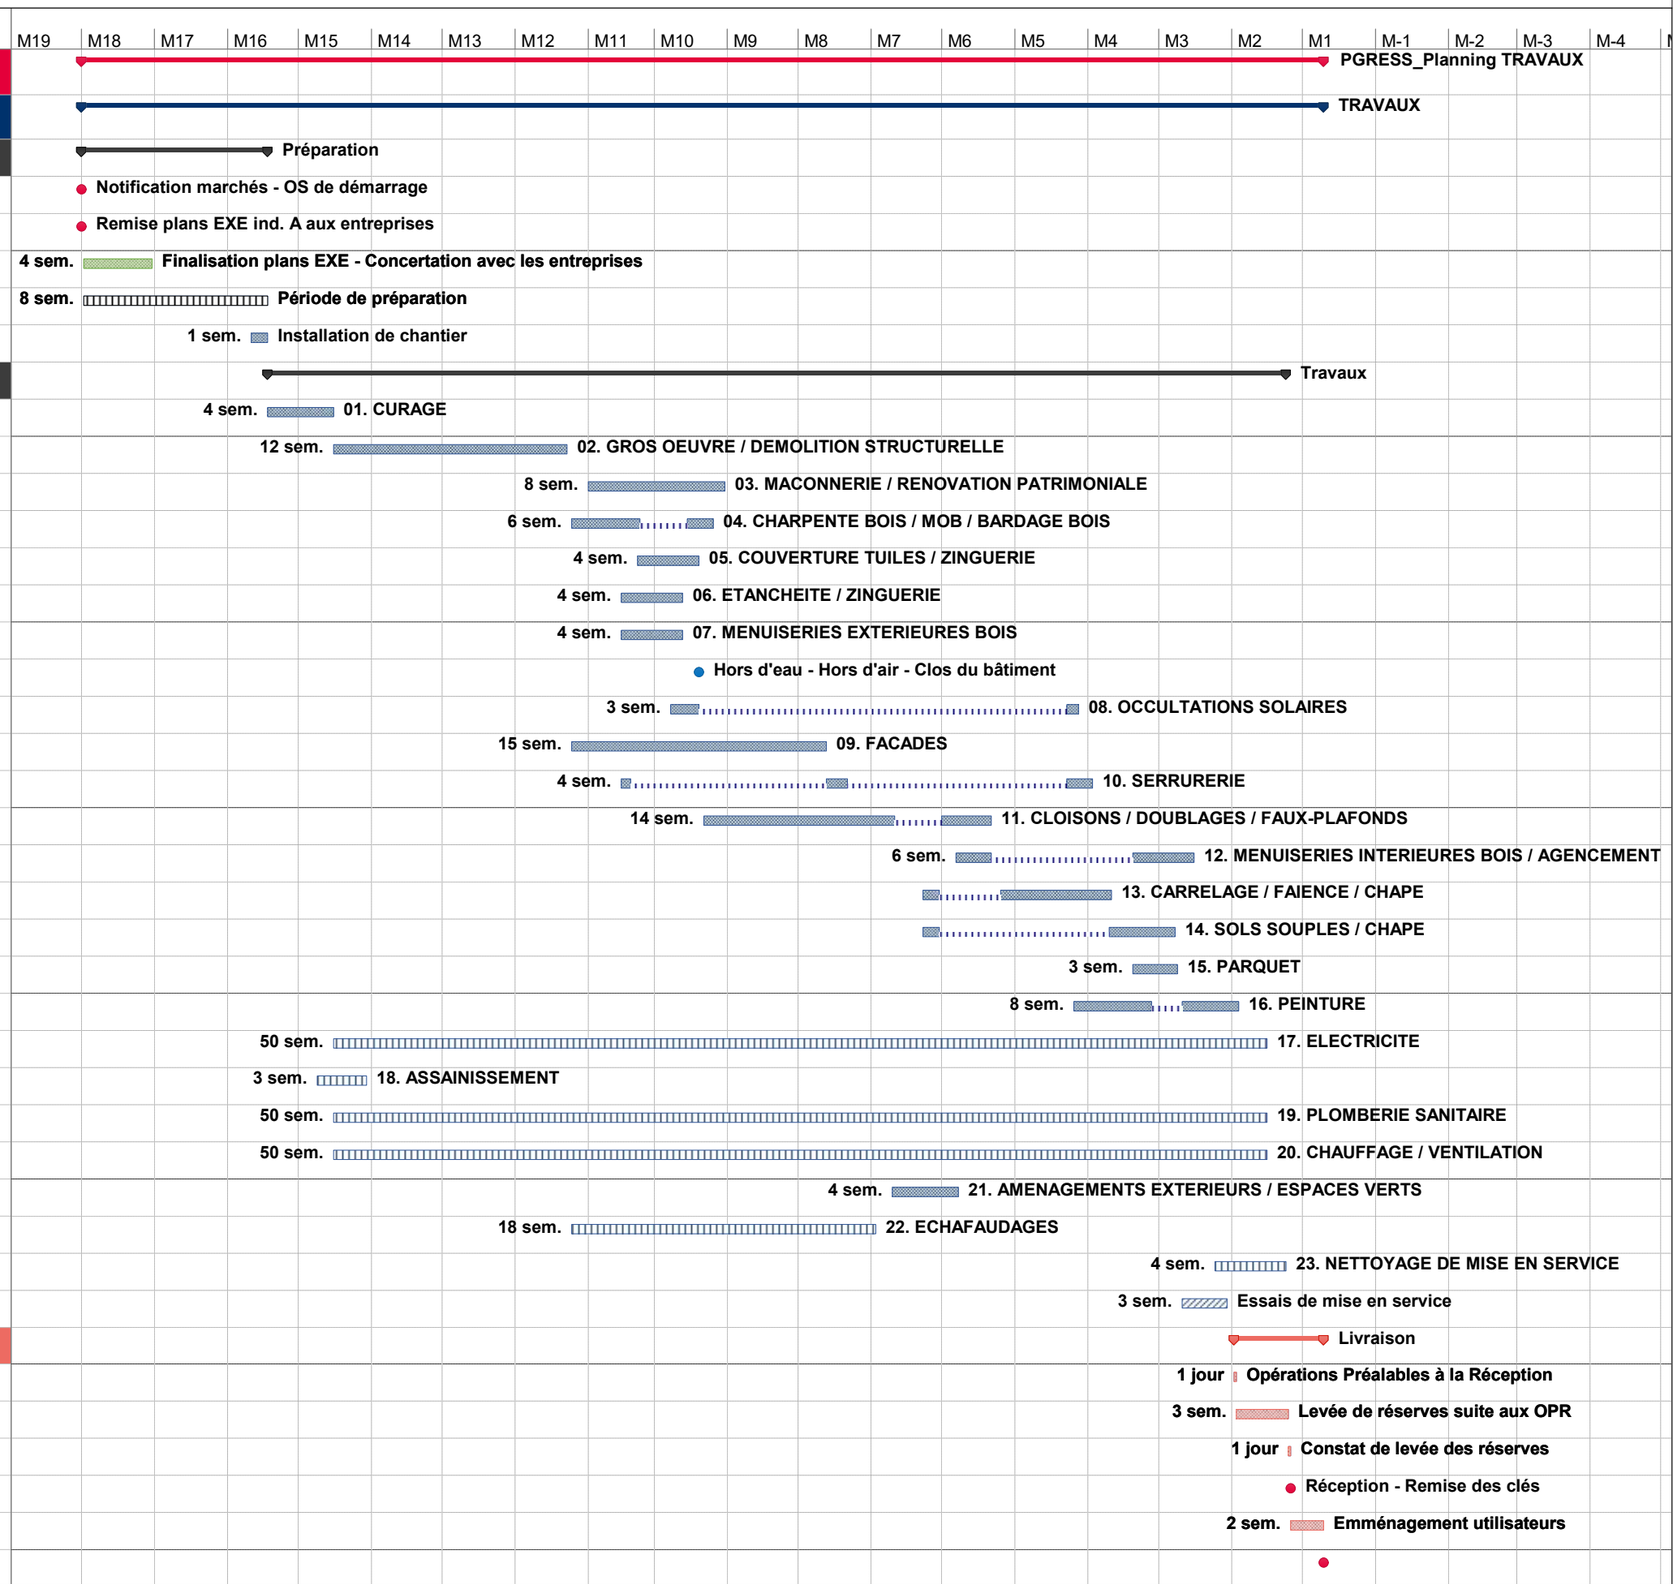

Planning hors intempéries non réputées prévisibles
Congés payés et jours fériés inclus
